



# Relatório de monitoramento dos OKRs do Senado Federal


OUTUBRO DE 2022



Adoção da  
sistemática OKR  
de planejamento

*Ato conjunto SGM e DGER nº 1 de 2020*

Início do 2º ciclo  
de OKRs e  
revisão dos  
resultados-chave

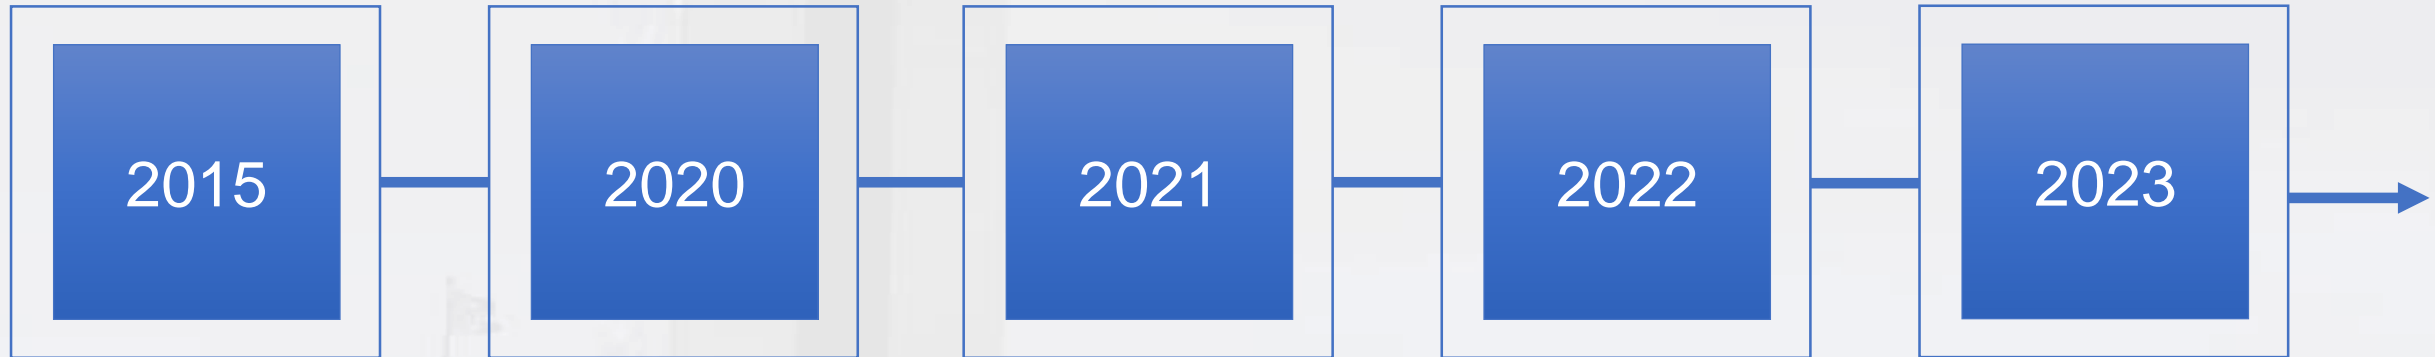

Criação dos  
elementos  
estratégicos do  
Senado Federal

*Ato da Comissão Diretora nº 5 de 2015*

Encerramento do  
1º ciclo de OKRs  
e revisão dos  
resultados-chave

*Ato conjunto SGM e DGER nº 1 de 2021*

Encerramento do  
ciclo estratégico  
iniciado em 2015



## Elementos Estratégicos



Visão

Ser referência de instituição legislativa reconhecida por sua excelência no exercício de suas funções constitucionais, com a participação da sociedade, caracterizando-se como alicerce da democracia, da federação e do desenvolvimento sustentável, e reconhecida por sua excelência no exercício da governança e gestão pública.



Missão

Exercer a representação das Unidades da Federação e as funções legislativa e fiscalizadora, fortalecendo o modelo democrático federativo, incentivando a participação da sociedade e a integração dos Estados, e promovendo, com justiça social, a qualidade de vida do povo brasileiro.



Valores

Compromisso com: o Parlamento; a excelência na prestação de serviços públicos; a qualidade de vida dos colaboradores; a igualdade; a livre disseminação de ideias; a transparência; a responsabilidade na utilização de recursos públicos; a sustentabilidade; a acessibilidade; a memória do Senado; a Comunidade.



Objetivos

1) Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso de recursos públicos; 2) Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho; 3) Valorizar as pessoas; 4) Fortalecer a transparência e a comunicação; 5) Priorizar as atividades fim do Senado; 6) Readequar a estrutura física; 7) Preservar a memória do Senado.



Objetivos

## 1. Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso de recursos públicos

Resultados  
-chave

KR 1.1 Automatizar 15 processos de gestão de pessoas via Central de Serviços

KR 1.2 Implementar Programa de rotulagem ambiental (Selo Verde) para as publicações gráficas

KR 1.3 Atualizar os 2 *datawarehouses* do processo de contratações

KR 1.4 Implantar sistemática de trabalho orientada a resultados

KR 1.5 Implantar modelo padronizado para exigência de garantia contratual

KR 1.6 Implementar sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções



Objetivos

## 2. Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

Resultados  
-chave

KR 2.1 Automatizar os encaminhamentos feitos à Presidência da sessão Plenária

KR 2.2 Implementar assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN

KR 2.3 Aportar solução de inteligência artificial a 1 processo orçamentário

KR 2.4 Automatizar o processo de pagamento de fornecedores

KR 2.5 Implantar 3 módulos de automação do processo de contratações

KR 2.6 Automatizar 2 fluxos de alterações contratuais

KR 2.7 Implantar sistema eletrônico de tramitação de processos da CEAPS

KR 2.8 Unificar bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados

KR 2.9 Implementar editor de textos normativos articulados (LexeditWeb)

KR 2.10 Automatizar o Registro de Decisão/Destino a partir dos Eventos Legislativos (Fluxo legislativo)

KR 2.11 Implementar melhorias no processo crítico de compras

KR 2.12 Implementar melhorias no processo crítico de capacitação



Objetivos

## 2. Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

Resultados  
-chave

KR 2.13 Implementar melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI

KR 2.14 Implementar melhorias no processo crítico de gestão de eventos

KR 2.15 Implementar melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços

KR 2.16 Publicar estudo sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto



Objetivos

### 3. Valorizar as pessoas

Resultados  
-chave

KR 3.1 Publicar nova  
Política de capacitação

KR 3.2 Utilizar  
parcerias para o  
lançamento de 2  
cursos de  
especialização por ano

KR 3.3 Utilizar  
parcerias para o  
lançamento de 2  
cursos de extensão  
por ano

KR 3.4 Instituir Seguro  
de  
Responsabilidade Civil  
de  
Diretores e  
Administradores

KR 3.5 Alcançar 200  
prestadores de saúde  
vinculados à rede do  
SIS

KR 3.6 Automatizar o  
plano de  
desenvolvimento  
individual (PDI)

KR 3.7 Lançar  
aplicativo para  
utilização do plano de  
saúde

KR 3.8 Implantar  
processo de  
atendimento a  
parlamentares e  
gabinetes

KR 3.9 Implementar a  
Central de  
Atendimento ao  
Servidor (GP e SIS)

KR 3.10 Reeditar  
Programa de  
Formação Gerencial  
(PFG))

KR 3.11 Implementar os  
planos de  
responsabilidade social  
-sustentabilidade,  
acessibilidade, resíduos  
sólidos e gênero e raça

KR 3.12 Implementar  
o serviço de  
atendimento remoto  
em libras



Objetivos

#### 4. Fortalecer a transparência e a comunicação

Resultados  
-chave

KR 4.1 Estabelecer diretrizes para a comunicação institucional do Senado

KR 4.2 Criar portal na internet com as informações da LGPD no Senado

KR 4.3 Publicar o Plano de Proteção de Dados Pessoais do Senado Federal

KR 4.4 Requalificar a oferta de Dados Abertos Legislativos

KR 4.5 Redesenhar a página de matérias legislativas com utilização de design UX

KR 4.6 Implantar sistema de indexação de pronunciamentos nas Comissões

KR 4.7 Implementar a descrição de imagens para acessibilidade na Intranet e Portal Senado Notícias





Objetivos

## 5. Readequar a estrutura física

Resultados  
-chave

KR 5.1 Implantar novo modelo de ambiente laboral

KR 5.2 Recuperar 100% das esquadrias do anexo I

KR 5.3 Substituir os sistemas de som dos Plenários das Comissões

KR 5.4 Adequar todos os Plenários das Comissões para realização de reuniões de forma remota ou semipresencial

KR 5.5 Adequar estrutura física das unidades de apoio a área legislativa em decorrência do modelo de trabalho



Objetivos

## 6. Preservar a memória do Senado

Resultados  
-chave

KR 6.1 Lançar a plataforma Arquivo Senado (AtoM + Archimática)

KR 6.2 Substituir o software da Biblioteca (Aleph) por uma Plataforma de Serviços (LSP)

KR 6.3 Disponibilizar na Central de Serviços solução para empréstimo e devolução de obras de arte

KR 6.4 Substituir a tecnologia de suporte à página de Anais do Senado



Objetivos

## 7. Priorizar as atividades fim do Senado

Resultados  
-chave

KR 7.1 Implementar aplicativo de informações legislativas

KR 7.2 Implementar sistemática de visualização da tramitação unificada Câmara/Senado

KR 7.3 Reativar o Grupo Interlegis de Tecnologia (GITEC)

KR 7.4 Obter a adesão de 10% dos vereadores ao Interlegis até o final da legislatura municipal

KR 7.5 Implementar plano de ação de segurança cibernética

KR 7.6 Implantar portal de normas federais

KR 7.7 Publicar novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense



## Gradiente de riscos dos resultados-chave



**Risco Alto:** o KR se encontra em uma situação que exige a atuação da Alta Direção do Senado ou de órgãos externos para avançar. Em outras palavras, a unidade responsável não possui, por conta própria, condições de evoluir esse resultado-chave.

**Risco Médio:** o KR se encontra em uma situação que exige a atuação da Direção da Secretaria (ou órgão correlato) para avançar. Em outras palavras, a unidade responsável acionou a direção daquela área para evoluir esse resultado-chave.

**Risco Baixo:** o KR se encontra em uma situação de evolução contínua que exige apenas a atuação das pessoas designadas na unidade responsável por esse resultado-chave.

## Situação Geral dos KR's

### 1. KR's alcançados até o mês atual




Resultados-chave concluídos: 14 (27% de 52)



## Situação Geral dos KR's


### 2. KR's em execução que avançaram seus indicadores: mês anterior x mês atual





## Situação Geral dos KR's


### 3. Modelo de projeto de T.I: mês atual

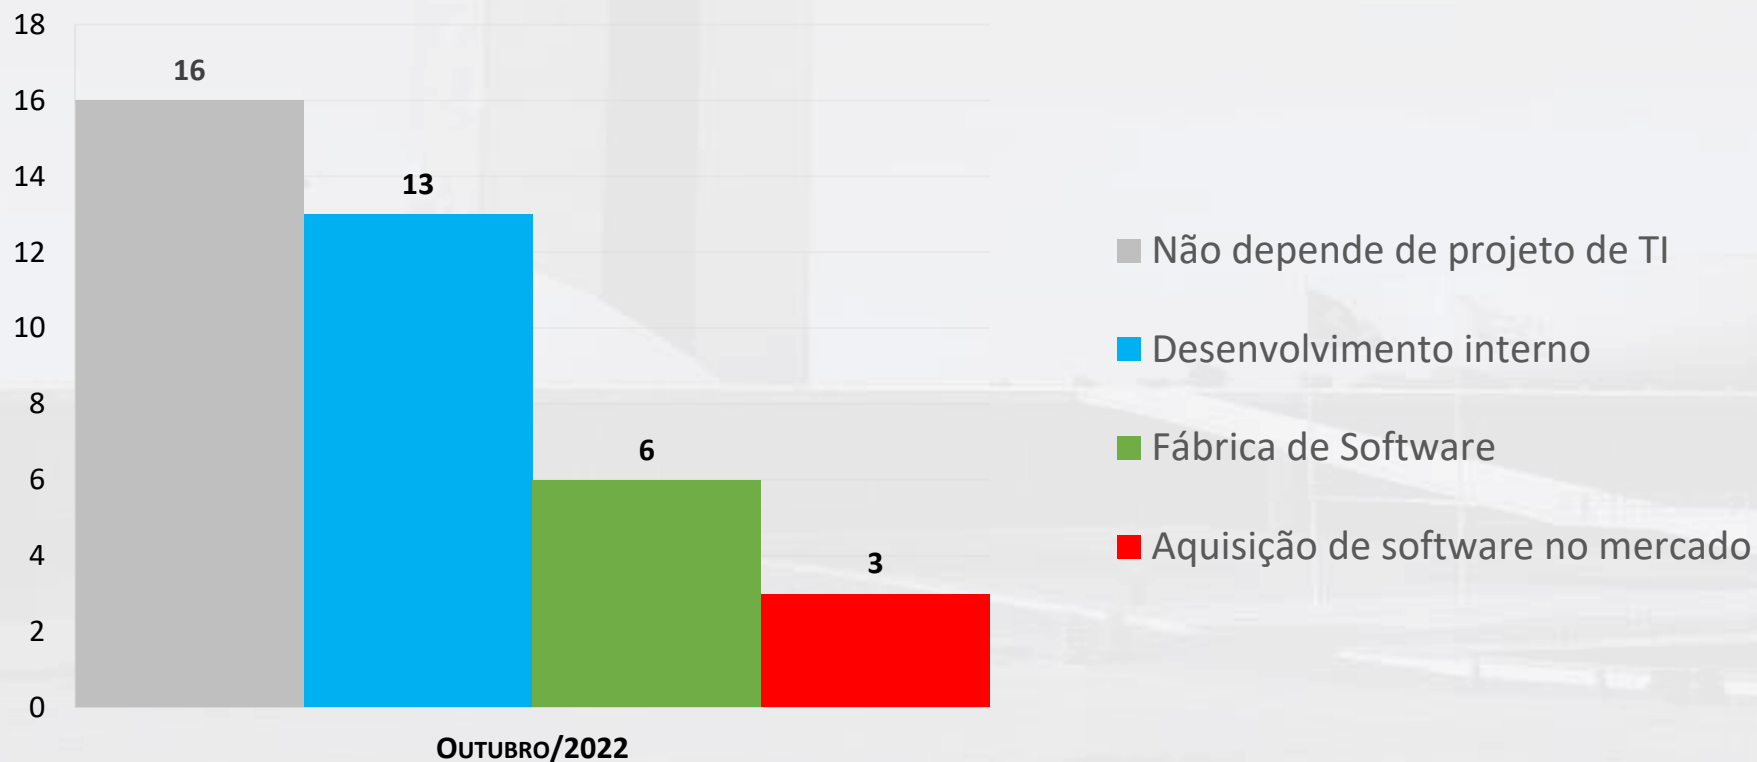



## Situação Geral dos KR's

### 4. Progresso dos projetos dependentes de T.I: mês anterior x mês atual

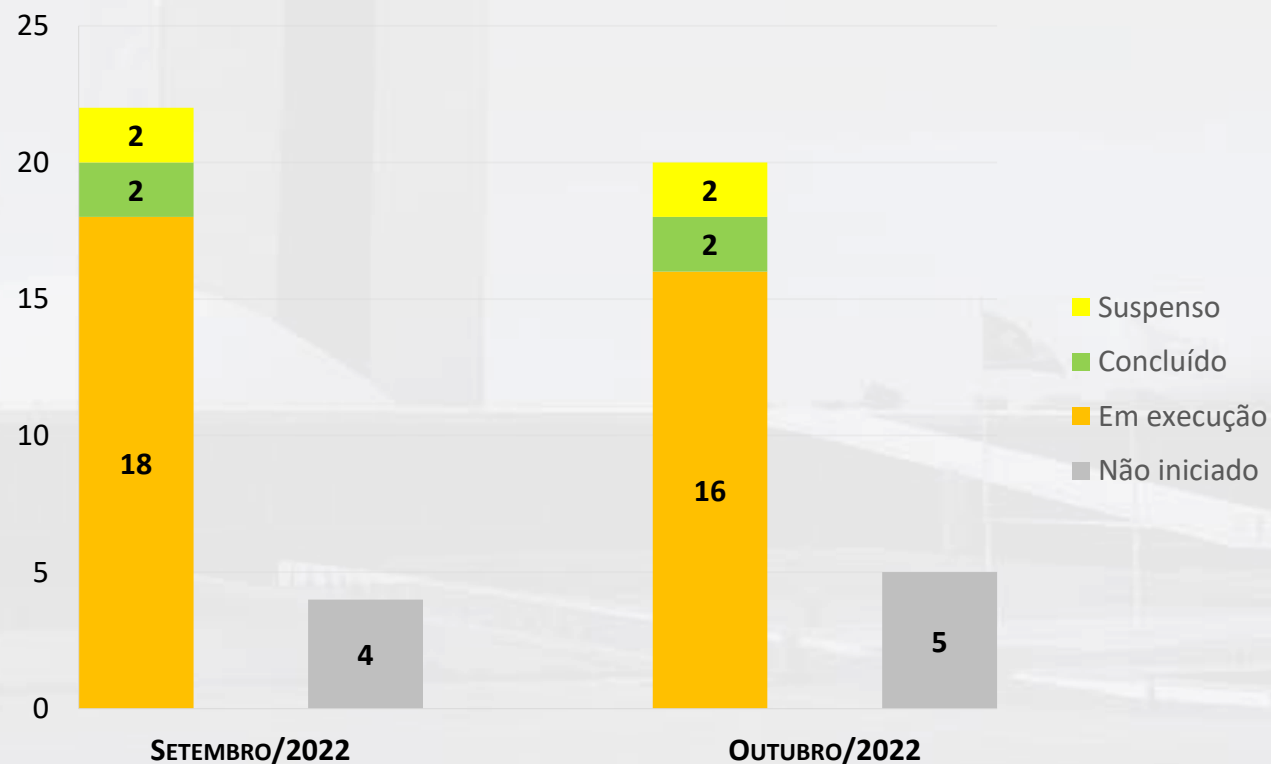






## Situação Geral dos KR's


### 5. Estágio das contratações: mês anterior x mês atual





## Situação Geral dos KR's

### 6. Grau de risco: mês anterior x mês atual

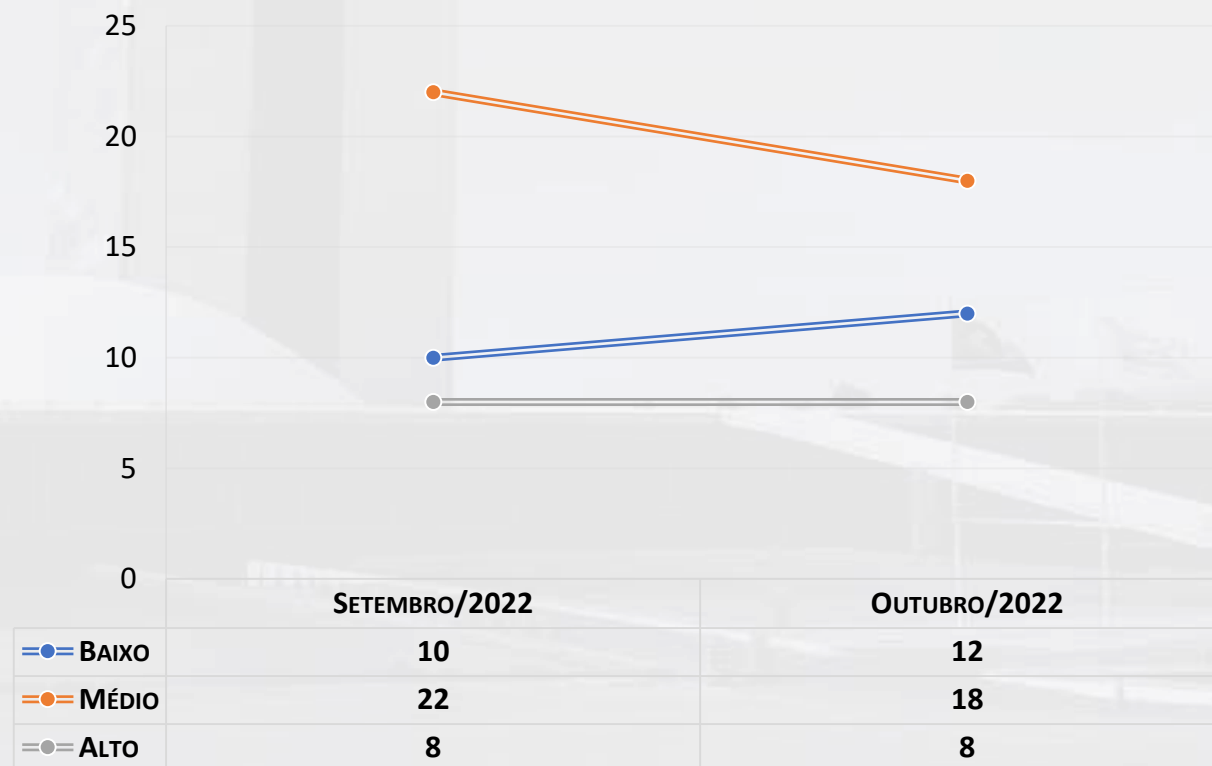



Objetivo

**1. Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso de recursos públicos**



## OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Automatizar 15 processos de gestão de pessoas via Central de Serviços

## RISCO

Médio

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

## UNIDADE RESPONSÁVEL

DIREG

## INDICADOR

Quantidade de processos de gestão de pessoas automatizados via Central de Serviços

**5/15**

**OBJETIVO**

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

**RESULTADO-CHAVE**

Automatizar 15 processos de gestão de pessoas via Central de Serviços

**INDICADOR**

Quantidade de processos de gestão de pessoas automatizados via Central de Serviços

**5/15**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Maior eficiência às operações da Secretaria de Gestão de Pessoas, observando-se os critérios de qualidade do processo, transparência das informações e conformidade legal;
- ✓ Melhor atendimento aos servidores ativos, aposentados e pensionistas, facilitando o relacionamento com o Senado, nas questões de recursos humanos;
- ✓ Celeridade nos processos por meio de tomada de decisão uniforme;
- ✓ Aumento da integração entre os processos de trabalho da Secretaria de Gestão de Pessoas.



## OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Implementar Programa de rotulagem ambiental (Selo Verde) para as publicações gráficas

## RISCO

Médio

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SEGRAF

## INDICADOR

Percentual de implementação do Programa de rotulagem ambiental

**25%**

**OBJETIVO**

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

**RESULTADO-CHAVE**

Implementar Programa de rotulagem ambiental (Selo Verde) para as publicações gráficas

**INDICADOR**

Percentual de implementação do Programa de rotulagem ambiental

**25%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Maior racionalização e eficiência nos processos gráficos;
- ✓ Transparência, mensuração e consolidação de índices ambientais;
- ✓ Materialidade do impacto da pegada ambiental;
- ✓ Adequação à legislação ambiental vigente.



## OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

## ATINGIMENTO

Incorporado pelo KR 2.11

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Atualizar os 2 datawarehouses do processo de contratações

## RISCO

Médio

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

## UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

## INDICADOR

Quantidade de datawarehouses do processo de contratações atualizados

**1/2**



**OBJETIVO**

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

**RESULTADO-CHAVE**

Atualizar os 2 datawarehouses do processo de contratações

**INDICADOR**

Quantidade de datawarehouses do processo de contratações atualizados

**1/2**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Análise apurada dos dados provenientes de diferentes sistemas;
- ✓ Acompanhamento transparente e gerencial dos processos de contratação;
- ✓ Tomada de decisão mais adequada e racional no que diz respeito aos processos de compras e contratações;
- ✓ Aumento da capacidade de planejamento de longo prazo quanto aos processos de compras e contratações.



## OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Implantar sistemática de trabalho orientada a resultados

## RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO  
PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

DGER

## INDICADOR

Percentual de implantação da sistemática de trabalho orientada a resultados

**75%**

**OBJETIVO**

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

**RESULTADO-CHAVE**

Implantar sistemática de trabalho orientada a resultados

**INDICADOR**

Percentual de implantação da sistemática de trabalho orientada a resultados

**75%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Controle por resultados e transformação no modelo de trabalho, com difusão do trabalho remoto;
- ✓ Mais eficiência do trabalho e mais transparência dos resultados.



## OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

## RESULTADO-CHAVE

Implantar modelo padronizado para exigência de garantia contratual

## RISCO

Médio

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Suspenso

## SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Licitação já realizada

## INDICADOR

Percentual de implantação do modelo padronizado para exigência de garantia contratual

**25%**

## UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

**OBJETIVO**

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

**RESULTADO-CHAVE**

Implantar modelo padronizado para exigência de garantia contratual

**INDICADOR**

Percentual de implantação do modelo padronizado para exigência de garantia contratual

**25%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Aperfeiçoamento do processo de gestão das garantias contratuais;
- ✓ Implementação dos fluxos sugeridos pelo Grupo de Trabalho para a gestão das garantias contratuais pelos gestores de contratos, Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade (SAFIN) e Secretaria de Administração de Contratações (SADCON);
- ✓ Reformulação do módulo "garantias" do sistema de Gestão de Contratos (GESCON) para refletir os novos fluxos, tornando-o mais intuitivo para o usuário (gestor do contrato) e possibilitando a emissão de relatórios relevantes para a tomada de decisão por parte das autoridades deliberativas;
- ✓ Automação do registro contábil das Garantias no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI:) redução da movimentação de processos pelo Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), da carga de trabalho da SAFIN, da SADCON e dos gestores de contratos.



## OBJETIVO

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Implementar sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções

## RISCO

Alto

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Concluído

## UNIDADE RESPONSÁVEL

PRODASEN

## INDICADOR

Percentual de implementação da sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções

**50%**

**OBJETIVO**

Aumentar a eficiência e a racionalidade no uso dos recursos públicos

**RESULTADO-CHAVE**

Implementar sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções

**INDICADOR**

Percentual de implementação da sistemática corporativa de desenvolvimento descentralizado de soluções

**50%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Ampliação da capacidade de desenvolver aplicações departamentais nas Secretarias do Senado.



Objetivo

**2. Melhorar de maneira  
contínua os processos de  
trabalho**





## OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

## ATINGIMENTO

Sim

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Automatizar os encaminhamentos feitos à Presidência da Sessão Plenária

## RISCO

Inexistente

## UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

## INDICADOR

Percentual de conclusão da automatização dos encaminhamentos feitos à Presidência

**100%**

## SERVIDOR RESPONSÁVEL

Fernando Sachetti

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

**RESULTADO-CHAVE**

Automatizar os encaminhamentos feitos à Presidência da Sessão Plenária

**INDICADOR**

Percentual de conclusão da automatização dos encaminhamentos feitos à Presidência

**100%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Atualização e acesso imediato às informações relacionadas à condução da sessão pelo Presidente do Senado, por conta do compartilhamento e simultaneidade próprios da nova sistemática;
- ✓ Racionalização no uso de papel, devido à dispensa de meios impressos para a criação e circulação de documentos;
- ✓ Eliminação de retrabalho em unidades que passam a utilizar as informações originais para a execução do seu trabalho;
- ✓ Facilitação do trabalho remoto, devido à responsividade dos documentos gerados, que podem ser consultados e editados em diversos dispositivos, inclusive móveis.



## OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

## RESULTADO-CHAVE

Implementar assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN

## RISCO

Médio

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

## SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Licitação já realizada

## INDICADOR

Percentual de implementação do sistema de assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN

**75%**

## UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

## VALOR DA CONTRATAÇÃO

R\$ 50.000,00  
para aquisição unitária

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

**RESULTADO-CHAVE**

Implementar assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN

**INDICADOR**

Percentual de implementação do sistema de assinatura eletrônica para os documentos e proposições legislativas do SF e do CN

**75%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Eliminação definitiva dos documentos e processados físicos e adoção do documento nato digital e do processado eletrônico;
- ✓ Plena concretização e implantação definitiva do processo legislativo eletrônico no âmbito do Senado Federal e no Congresso Nacional.



## OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

## ATINGIMENTO

Sim

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Aportar solução de inteligência artificial a 1 processo orçamentário

## RISCO

Inexistente

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Concluído

## UNIDADE RESPONSÁVEL

CONORF

## INDICADOR

Quantidade de processos orçamentários que receberam o aporte de soluções de inteligência artificial

1/1

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

**RESULTADO-CHAVE**

Aportar solução de inteligência artificial a 1 processo orçamentário

**INDICADOR**

Quantidade de processos orçamentários que receberam o aporte de soluções de inteligência artificial

**1/1**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Disponibilização de ferramenta para simplificar o processo de emendamento de projeto de lei orçamentária;
- ✓ Ampliação da aderência entre projetos políticos e benefícios para a sociedade.



## OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Automatizar o processo de pagamento de fornecedores

## RISCO

Médio

## INDICADOR

Percentual de conclusão da automatização do processo de pagamento de fornecedores

**50%**

## UNIDADE RESPONSÁVEL

SAFIN

## SERVIDOR RESPONSÁVEL

Humberto Gauche

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

**RESULTADO-CHAVE**

Automatizar o processo de pagamento de fornecedores

**INDICADOR**

Percentual de conclusão da automatização do processo de pagamento de fornecedores

**50%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Redução de riscos relacionados ao lançamento manual de dados no decorrer do processo de pagamento de fornecedores;
- ✓ Aumento de padronização, eficiência e agilidade no processo de pagamento de fornecedores.





## OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

## RESULTADO-CHAVE

Implantar 3 módulos de automação do processo de contratações

## INDICADOR

Quantidade de módulos de automação do processo de contratações implantados

0/3

## ATINGIMENTO

Incorporado pelo KR 2.11

## RISCO

Alto

## UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Suspensão

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

## SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Já iniciada a tramitação do processo de contratação (processo já saiu do órgão técnico)

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

**RESULTADO-CHAVE**

Implantar 3 módulos de automação do processo de contratações

**INDICADOR**

Quantidade de módulos de automação do processo de contratações implantados

**0/3**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Transformação automatizada de Termos de Referência em Editais de Compras;
- ✓ Mitigação de erros no conteúdo dos Editais de Compras;
- ✓ Padronização de documentos relacionados ao processo de contratação em alinhamento às boas práticas mais recentes;
- ✓ Constituição de uma base de dados atualizada de disposições legais e jurisprudenciais.



## OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

## ATINGIMENTO

Incorporado pelo KR 2.11

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Automatizar 2 fluxos de alterações contratuais

## RISCO

Baixo

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

## UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

## INDICADOR

Quantidade de fluxos de alterações contratuais automatizados

0/2

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

**RESULTADO-CHAVE**

Automatizar 2 fluxos de alterações contratuais

**INDICADOR**

Quantidade de fluxos de alterações contratuais automatizados

**0/2**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Redução no tempo e nos custos necessários para conclusão do processo de renovação contratual;
- ✓ Padronização das minutas de termo aditivo e de apostilamento contratual;
- ✓ Padronização das metodologias de cálculo de processos de renovação e reajuste contratual;
- ✓ Mitigação de erros humanos ao longo do processo de renovação e reajuste contratual.



## OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

## ATINGIMENTO

Sim

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Implantar sistema eletrônico de tramitação de processos da CEAPS

## RISCO

Inexistente

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Concluído

## UNIDADE RESPONSÁVEL

SAFIN

## INDICADOR

Percentual de implantação do sistema eletrônico de tramitação de processos da CEAPS

**100%**

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

**RESULTADO-CHAVE**

Implantar sistema eletrônico de tramitação de processos da CEAPS

**INDICADOR**

Percentual de implantação do sistema eletrônico de tramitação de processos da CEAPS

**100%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Aumento da celeridade no processo de ressarcimento das despesas parlamentares à conta da CEAPS no âmbito das suas atividades institucionais nos Estados de origem;
- ✓ Ampliação da mobilidade na coleta de assinaturas dos parlamentares e da fluidez na tramitação intersetorial;
- ✓ Gerenciamento das operações, identificando as etapas mais complexas, e oferecendo ao gestor maior eficiência no controle dos pontos de atenção.



## OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Unificar bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados

## RISCO

Alto

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

## UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

## INDICADOR

Percentual de conclusão da unificação das bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados

**25%**

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

**RESULTADO-CHAVE**

Unificar bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados

**INDICADOR**

Percentual de conclusão da unificação das bases de normas jurídicas com a Câmara dos Deputados

**25%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Aumento da credibilidade da informação sobre normas jurídicas prestadas para a sociedade.





## OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Implementar editor de textos normativos articulados (LexEdit Web)

## RISCO

Alto

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

## UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

## INDICADOR

Percentual de implementação do editor de textos normativos articulados

**50%**

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

**RESULTADO-CHAVE**

Implementar editor de textos normativos articulados (LexEdit Web)

**INDICADOR**

Percentual de implementação do editor de textos normativos articulados

**50%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Proposições legislativas estruturadas, que permitem a utilização do seu produto durante todo o processo legislativo, sem o retrabalho de produzir novamente o mesmo texto.



## OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Automatizar o Registro de Decisão/Destino a partir dos Eventos Legislativos (Fluxo legislativo)

## RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO  
PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SGM

## INDICADOR

Percentual de conclusão da automatização do processo de registro de decisão/destino a partir dos Eventos Legislativos

**25%**

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

**RESULTADO-CHAVE**

Automatizar o Registro de Decisão/Destino a partir dos Eventos Legislativos (Fluxo legislativo)

**INDICADOR**

Percentual de conclusão da automatização do processo de registro de decisão/destino a partir dos Eventos Legislativos

**25%****BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Atualização imediata dos painéis legislativos quanto às deliberações das comissões e do plenário do Senado Federal;
- ✓ Redução do número de decisões não lançadas no sistema Legis por erro humano.



## OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

## RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de compras

## RISCO

Médio

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

## SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Licitação já realizada

## INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de compras

**25%**

## UNIDADE RESPONSÁVEL

DIRECON

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

**RESULTADO-CHAVE**

Implementar melhorias no processo crítico de compras

**INDICADOR**

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de compras

**25%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Automação de processos de compras e contratações;
- ✓ Agilidade nas compras e contratações.



## OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

## RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de capacitação

## RISCO

Médio

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

## SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

No órgão técnico para elaboração do Termo de Referência

## INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de capacitação

**33,2%**

## UNIDADE RESPONSÁVEL

ILB

## VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$360.000,00

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

**RESULTADO-CHAVE**

Implementar melhorias no processo crítico de capacitação

**INDICADOR**

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de capacitação

**33,2%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Estabilidade para a plataforma de ensino Saberes;
- ✓ Capacidade de realizar atualizações na plataforma de ensino Saberes sempre que forem necessárias.





## OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI

## RISCO

Médio

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

PRODASEN

## INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI

**25%**

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

**RESULTADO-CHAVE**

Implementar melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI

**INDICADOR**

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de gestão de demandas de TI

**25%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Transparência quanto as demandas de TI do Senado Federal no que diz respeito a tratamento, acompanhamento, monitoramento, entrega e satisfação dos clientes;
- ✓ Insumos para o balanceamento de recursos e da carga de trabalho das equipes de TI do Senado.



## OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de gestão de eventos

## RISCO

Baixo

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

## UNIDADE RESPONSÁVEL

SECOM

## INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de eventos

**25%**

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

**RESULTADO-CHAVE**

Implementar melhorias no processo crítico de gestão de eventos

**INDICADOR**

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de eventos

**25%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Evolução dos fluxos de trabalho relacionados a gestão de eventos;
- ✓ Redução de problemas recorrentes na gestão dos eventos do Senado Federal nas fase a seguir:
  - criação e aprovação de evento institucional;
  - definição de equipe de trabalho;
  - reunião de briefing;
  - providências para realização do evento;
  - reunião de controle (quando necessário);
  - execução do evento;
  - pós-evento.



## OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Implementar melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços

## RISCO

Médio

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Não iniciado

## UNIDADE RESPONSÁVEL

SINFRA

## INDICADOR

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços

**25%**

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

**RESULTADO-CHAVE**

Implementar melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços

**INDICADOR**

Percentual de conclusão da ação de melhorias no processo crítico de reformas e ocupação de espaços

**25%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Agilidade no processo reformas e ocupação de espaços;
- ✓ Diminuição no tempo de atendimento das demandas por reformas e ocupação de espaços.



## OBJETIVO

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Publicar estudo sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto

## RISCO

Baixo

## UNIDADE RESPONSÁVEL

CONLEG

## INDICADOR

Quantidade de estudos sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto publicados

0/1

**OBJETIVO**

Melhorar de maneira contínua os processos de trabalho

**RESULTADO-CHAVE**

Publicar estudo sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto

**INDICADOR**

Quantidade de estudos sobre a avaliação do impacto no processo legislativo e político advindo da adoção do sistema de deliberação remoto publicados

**0/1**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Mensuração do impacto do sistema deliberativo remoto (SDR) sobre a dinâmica do processo legislativo no Senado Federal;
- ✓ Compreensão sobre como o SDR também impactou os processos de trabalho e as equipes envolvidas direta ou indiretamente com o processo legislativo;
- ✓ Avaliação de como o SDR pode permanecer como instrumento de auxílio/execução do processo legislativo, em face dos resultados observados;
- ✓ Encaminhamentos sobre fortalecimento/capacitação do capital humano envolvido direta/indiretamente no processo legislativo.





Objetivo

### **3. Valorizar as pessoas**



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## ATINGIMENTO

Incorporado  
pelo KR 2.12DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Publicar nova Política de  
capacitação

## RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO  
PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

ILB e SEGP

## INDICADOR

Quantidade de novas Políticas  
de capacitação publicadas

0/1



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## RESULTADO-CHAVE

Publicar nova Política de capacitação

## INDICADOR

Quantidade de novas Políticas de capacitação publicadas

0/1

## BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Novo mecanismo de planejamento e realização de capacitação.



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Utilizar parcerias para o  
lançamento de 2 cursos de  
especialização por ano

## RISCO

Alto

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

ILB

## INDICADOR

Quantidade de cursos de  
especialização lançados por  
ano com a utilização de  
parcerias**0/2**



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## RESULTADO-CHAVE

Utilizar parcerias para o lançamento de 2 cursos de especialização por ano

## INDICADOR

Quantidade de cursos de especialização lançados por ano com a utilização de parcerias

0/2

## BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Formação especializada de servidores em áreas essenciais para a atuação alinhada com as atribuições institucionais do Parlamento;
- ✓ Desenvolvimento de competências intelectuais, técnicas e interpessoais aplicáveis no contexto laboral;
- ✓ Incentivo à aprendizagem contínua e ao autodesenvolvimento profissional;
- ✓ Suprimento de lacunas de formação do quadro técnico em áreas críticas;
- ✓ Valorização do corpo funcional por meio de oportunidade de capacitação interna de nível superior;
- ✓ Produção, difusão e gestão de conhecimentos especializados adequados à realidade e às necessidades de formação profissional do setor público, em especial do Poder Legislativo;
- ✓ Atuação complementar em relação a outras escolas de governo e instituições federais de ensino, para a oferta de formação continuada e de atualização para servidores públicos.



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Utilizar parcerias para o  
lançamento de 2 cursos  
de extensão por ano

## RISCO

Inexistente

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

ILB

## INDICADOR

Quantidade de cursos de  
extensão lançados por ano  
com a utilização de parcerias**2/2**



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## RESULTADO-CHAVE

Utilizar parcerias para o lançamento de 2 cursos de extensão por ano

## INDICADOR

Quantidade de cursos de extensão lançados por ano com a utilização de parcerias

2/2

## BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Formação especializada de servidores em áreas essenciais para a atuação alinhada com as atribuições institucionais do Parlamento;
- ✓ Desenvolvimento de competências intelectuais, técnicas e interpessoais aplicáveis no contexto laboral;
- ✓ Incentivo à aprendizagem contínua e ao autodesenvolvimento profissional;
- ✓ Suprimento de lacunas de formação do quadro técnico em áreas críticas;
- ✓ Valorização do corpo funcional por meio de oportunidade de capacitação interna de nível superior;
- ✓ Produção, difusão e gestão de conhecimentos especializados adequados à realidade e às necessidades de formação profissional do setor público, em especial do Poder Legislativo;
- ✓ Atuação complementar em relação a outras escolas de governo e instituições federais de ensino, para a oferta de formação continuada e de atualização para servidores públicos.



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## ATINGIMENTO

Suspenso

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Sim

## RESULTADO-CHAVE

Instituir Seguro de  
Responsabilidade Civil de  
Diretores e Administradores

## RISCO

Alto

SITUAÇÃO DA  
CONTRATAÇÃONão há item correspondente  
no Plano de Contratação

## INDICADOR

Quantidade de Seguros  
de Responsabilidade Civil  
de Diretores e Administradores  
instituídos**0/1**UNIDADE  
RESPONSÁVEL

DGER





## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Alcançar 200 prestadores de  
saúde vinculados à rede do SIS

## RISCO

Inexistente

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SEGP

## INDICADOR

Quantidade de prestadores de  
saúde vinculados à rede do  
SIS alcançados**+230/200**



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## RESULTADO-CHAVE

Alcançar 200 prestadores de saúde vinculados à rede do SIS

## INDICADOR

Quantidade de prestadores de saúde vinculados à rede do SIS alcançados

**+230/200**

## BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Autossuficiência de assistência à saúde, no DF, aos mais de 17 mil beneficiários associados ao SIS;
- ✓ Atendimento direto para resolução de demandas;
- ✓ Prazos menores no processo de autorização de procedimentos;
- ✓ Cobertura de procedimentos além do rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Automatizar o plano de  
desenvolvimento individual  
(PDI)

## RISCO

Inexistente

SITUAÇÃO DO  
PROJETO DE TI

Concluído

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SEGP

## INDICADOR

Percentual de conclusão da  
automatização do plano de  
desenvolvimento individual**100%**

**OBJETIVO**

Valorizar as pessoas

**RESULTADO-CHAVE**

Automatizar o plano de desenvolvimento individual (PDI)

**INDICADOR**

Percentual de conclusão da automatização do plano de desenvolvimento individual

**100%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Mecanismo inovador de avaliação de desempenho;
- ✓ Nova ferramenta para planejamento de capacitações.



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Lançar aplicativo para utilização  
do plano de saúde

## RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO  
PROJETO DE TI

Não iniciado

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SEGP

## INDICADOR

Quantidade de aplicativos para  
utilização do plano de  
saúde lançados

0/1



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## RESULTADO-CHAVE

Lançar aplicativo para utilização do plano de saúde

## INDICADOR

Quantidade de aplicativos para utilização do plano de saúde lançados

0/1

## BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Aumento de celeridade e transparência ao consultar os dados relacionados ao plano de saúde;
- ✓ Acompanhamento, em tempo real, da situação das solicitações feitas pelos prestadores de saúde;
- ✓ Consulta fácil aos extratos e demais informações financeiras.



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Implantar processo de  
atendimento a parlamentares e  
gabinetes

## RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DO  
PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SGM

## INDICADOR

Percentual de implantação do  
processo de atendimento a  
parlamentares e gabinetes**75%**



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## RESULTADO-CHAVE

Implantar processo de atendimento a parlamentares e gabinetes

## INDICADOR

Percentual de implantação do processo de atendimento a parlamentares e gabinetes

**75%**

## BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Solução de TI para carregamento de documentação de posse de senadores;
- ✓ Celeridade na recepção, análise e cadastro dos documentos do senador empossado;
- ✓ Incremento positivo na imagem do Senado aos parlamentares recém-empossados;
- ✓ Atendimento de excelência na solução de problemas funcionais e organizacionais dos novos parlamentares diante da instituição.





## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Sim

## RESULTADO-CHAVE

Implementar a Central de  
Atendimento ao Servidor  
(GP e SIS)

## RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO  
PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA  
CONTRATAÇÃONo órgão técnico para  
elaboração do Termo  
de Referência

## INDICADOR

Percentual de implementação  
da Central de Atendimento ao  
Servidor**75%**UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SEGP

VALOR ESTIMADO DA  
CONTRATAÇÃOR\$ 1.149.000,00  
por ano



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## RESULTADO-CHAVE

Implementar a Central de Atendimento ao Servidor (GP e SIS)

## INDICADOR

Percentual de implementação da Central de Atendimento ao Servidor

**75%**

## BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Porta de entrada única para todas as demandas abrangidas pela Secretaria de Gestão de Pessoas;
- ✓ Aumento da acessibilidade no atendimento por meio de balcão de serviços expressos;
- ✓ Atendimento presencial de fácil localização e centrado em aposentados e pensionistas.



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Reeditar Programa de  
Formação Gerencial (PFG)

## RISCO

Inexistente

## INDICADOR

Quantidade de Programas de  
Formação Gerencial reeditados

1/1

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

ILB



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## RESULTADO-CHAVE

Reeditar Programa de  
Formação Gerencial (PFG)

## INDICADOR

Quantidade de Programas de  
Formação Gerencial reeditados

1/1

## BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Desenvolvimento de competências gerenciais nos líderes do Senado Federal;
- ✓ Potencialização de habilidades nos líderes do Senado Federal;
- ✓ Compartilhamento de conhecimentos para o exercício das funções de gerência, com a aplicação de melhores práticas de gestão e liderança.



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Sim

## RESULTADO-CHAVE

Implementar os planos de  
responsabilidade social -  
sustentabilidade, acessibilidade,  
resíduos sólidos e gênero e raça

## RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO  
PROJETO DE TI

Em execução

SITUAÇÃO DA  
CONTRATAÇÃO

No órgão de contratações  
para seguimento processual

## INDICADOR

Percentual de implementação  
dos planos de  
responsabilidade social

**25%**UNIDADE  
RESPONSÁVEL

NCAS

VALOR ESTIMADO DA  
CONTRATAÇÃO

R\$ 30.000,00  
por ano



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## RESULTADO-CHAVE

Implementar os planos de responsabilidade social - sustentabilidade, acessibilidade, resíduos sólidos e gênero e raça

## INDICADOR

Percentual de implementação dos planos de responsabilidade social

**25%**

## BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Promoção da sustentabilidade, da acessibilidade e da equidade de gênero e raça;
- ✓ Alinhamento com os interesses coletivos, as expectativas da sociedade brasileira e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).



## OBJETIVO

Valorizar as pessoas

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Sim

## RESULTADO-CHAVE

Implementar o serviço de  
atendimento remoto em libras

## RISCO

Baixo

SITUAÇÃO DA  
CONTRATAÇÃONo órgão de contratações  
para seguimento processual

## INDICADOR

Percentual de implementação  
do serviço de atendimento  
remoto em libras**50%**UNIDADE  
RESPONSÁVEL

NCAS

VALOR ESTIMADO DA  
CONTRATAÇÃOR\$ 153.600,00  
por ano

**OBJETIVO**

Valorizar as pessoas

**RESULTADO-CHAVE**

Implementar o serviço de atendimento remoto em libras

**INDICADOR**

Percentual de implementação do serviço de atendimento remoto em libras

**50%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Tradução entre português e Libras (Língua Brasileira de Sinais), para colaboradores e visitantes do Senado Federal;
- ✓ Garantia de comunicação entre surdos e pessoas ouvintes não fluentes na língua de sinais no âmbito do Senado.





Objetivo

## **4. Fortalecer a transparência e a comunicação**



## OBJETIVO

Fortalecer a transparência  
e a comunicação

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Estabelecer diretrizes para a  
comunicação institucional do  
Senado

## RISCO

Alto

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SECOM

## INDICADOR

Quantidade de diretrizes de  
comunicação do Senado  
estabelecidas

**0/15**

**OBJETIVO**

**Fortalecer a transparência  
e a comunicação**

**RESULTADO-CHAVE**

Estabelecer diretrizes para a  
comunicação institucional do  
Senado

**INDICADOR**

Quantidade de diretrizes de  
comunicação do Senado  
estabelecidas

**0/15**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Ampliação do alcance e aumento do público dos produtos e serviços de comunicação do Senado Federal;
- ✓ Divulgação de informações que favoreçam um melhor entendimento do papel, das rotinas, dos atos e processos decisórios do Senado Federal;
- ✓ Diversificação das possibilidades de interação com a sociedade, estimulando a participação consciente e um diálogo respeitoso para aprimorar o debate público;
- ✓ Valorização da representação político-parlamentar, por meio do apoio à conexão entre cidadãos e seus representantes eleitos, enfatizando que o Parlamento é fundamental para a democracia e para a garantia de direitos e liberdades individuais;
- ✓ Aumento da integração entre os setores do Senado para produção e divulgação de conteúdo legislativo e institucional, a fim de aumentar o alcance e o acesso à informação legislativa;
- ✓ Fluxos de produção integrada e ações conjuntas para racionalizar as atividades de comunicação e evitar o retrabalho;
- ✓ Ampliação da eficácia do uso de recursos de comunicação, tanto materiais quanto humanos;
- ✓ Aumento da clareza acerca dos critérios de qualidade dos produtos e serviços de comunicação.



## OBJETIVO

Fortalecer a transparência  
e a comunicação

## ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Criar portal na internet com as  
informações da LGPD no Senado

## RISCO

Inexistente

SITUAÇÃO DO  
PROJETO DE TI

Concluído

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SGIDOC

## INDICADOR

Quantidade de portais na  
internet com as informações  
da LGPD no Senado criados

1/1

**OBJETIVO**

Fortalecer a transparência  
e a comunicação

**RESULTADO-CHAVE**

Criar portal na internet com as  
informações da LGPD no Senado

**INDICADOR**

Quantidade de portais na  
internet com as informações  
da LGPD no Senado criados

**1/1**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Adequação do Senado, como controlador de dados pessoais, à disposição legal contida no art. 9º da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), que prevê que o titular de dados pessoais tenha acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados;
- ✓ Evolução positiva do relacionamento com os usuários dos serviços do Senado Federal; espera-se que o acesso fácil às informações gere satisfação e esclareça dúvidas e questionamentos;
- ✓ Aprofundamento da cultura de proteção de dados pessoais no Senado.



## OBJETIVO

Fortalecer a transparência  
e a comunicação

## ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Publicar o Plano de Proteção de  
Dados Pessoais do Senado  
Federal

## RISCO

Baixo

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SGIDOC

## INDICADOR

Quantidade de planos de  
proteção de dados pessoais do  
Senado Federal publicados

1/1

**OBJETIVO**

Fortalecer a transparência  
e a comunicação

**RESULTADO-CHAVE**

Publicar o Plano de Proteção de  
Dados Pessoais do Senado  
Federal

**INDICADOR**

Quantidade de planos de  
proteção de dados pessoais do  
Senado Federal publicados

**1/1**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Sistematização das ações de adequação à LGPD do Senado Federal em um único documento, com metas, prazos e indicadores;
- ✓ Realização das ações de adequação à LGPD no Senado Federal;
- ✓ Monitoramento das ações de adequação à LGPD no Senado;
- ✓ Aumento do nível de segurança à privacidade dos dados pessoais tratados pelas várias áreas do Senado.



## OBJETIVO

Fortalecer a transparência  
e a comunicação

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Requalificar a oferta de Dados  
Abertos Legislativos

## RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO  
PROJETO DE TI

Concluído

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SGM

## INDICADOR

Percentual de requalificação no  
Portal de Dados Abertos  
Legislativos

**50%**



**OBJETIVO**

Fortalecer a transparência  
e a comunicação

**RESULTADO-CHAVE**

Requalificar a oferta de Dados  
Abertos Legislativos

**INDICADOR**

Percentual de requalificação no  
Portal de Dados Abertos  
Legislativos

**50%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Portal de Dados Abertos Legislativos com incremento na disponibilização de dados que a sociedade possa verificar, esclarecer, fiscalizar e acompanhar as informações produzidas na atividade legislativa;
- ✓ Aumento da transparência sobre as informações produzidas na atividade legislativa.



## OBJETIVO

Fortalecer a transparência  
e a comunicação

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Redesenhar a página de  
matérias legislativas com  
utilização de design UX

## RISCO

Baixo

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SGM

## INDICADOR

Quantidade de páginas de  
matérias legislativas com  
utilização de design UX  
redesenhadas

0/1

**OBJETIVO**

Fortalecer a transparência  
e a comunicação

**RESULTADO-CHAVE**

Redesenhar a página de  
matérias legislativas com  
utilização de design UX

**INDICADOR**

Quantidade de páginas de  
matérias legislativas com  
utilização de design UX  
redesenhadas

**0/1**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Páginas de matérias legislativas com informações oferecidas de forma organizada, harmônica, interativa e intuitiva;
- ✓ Aumento na compreensão das etapas legislativas pelos cidadãos;
- ✓ Aproximação dos cidadãos com o Senado Federal meio da interação e da transparência promovidas pelo redesenho design User Experience (UX).



## OBJETIVO

Fortalecer a transparência  
e a comunicação

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Implantar sistema de indexação  
de pronunciamentos nas  
Comissões

## RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO  
PROJETO DE TI

Suspensão

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SGM

## INDICADOR

Percentual de implantação do  
sistema de indexação de  
pronunciamento nas  
Comissões

**25%**

**OBJETIVO**

Fortalecer a transparência  
e a comunicação

**RESULTADO-CHAVE**

Implantar sistema de indexação  
de pronunciamentos nas  
Comissões

**INDICADOR**

Percentual de implantação do  
sistema de indexação de  
pronunciamento nas  
Comissões

**25%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Disponibilização dos pronunciamentos realizados nas reuniões e audiências das Comissões de forma tratada e classificada;
- ✓ Ampliação do acesso aos pronunciamentos realizados nas reuniões e audiências das Comissões informações pelos cidadãos.



## OBJETIVO

Fortalecer a transparência  
e a comunicação

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Implementar a descrição de  
imagens para acessibilidade na  
Intranet e Portal Senado  
Notícias

## RISCO

Médio

SITUAÇÃO DO  
PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SECOM

## INDICADOR

Percentual de implementação  
a descrição de imagens para  
acessibilidade na Intranet  
e Portal Senado Notícias

**75%**

MODELO DE PROJETO  
DE TI

Desenvolvimento  
Interno

**OBJETIVO**

Fortalecer a transparência  
e a comunicação

**RESULTADO-CHAVE**

Implementar a descrição de  
imagens para acessibilidade na  
Intranet e Portal Senado  
Notícias

**INDICADOR**

Percentual de implementação  
a descrição de imagens para  
acessibilidade na Intranet  
e Portal Senado Notícias

**75%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Disponibilização dos conteúdos publicados no Portal Senado Notícias e na intranet do Senado às pessoas com deficiência visual.
- ✓ Aumento da transparência do Senado Federal sobre atividades desenvolvidas por esta Casa Legislativa.



Objetivo

## 5. Readequar a estrutura física





## OBJETIVO

Readequar a estrutura física

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Implantar novo modelo de ambiente laboral

## RISCO

Baixo

## UNIDADE RESPONSÁVEL

SINFRA

## INDICADOR

Percentual de implementação do novo modelo de ambiente laboral

**25%**

**OBJETIVO**

Readequar a estrutura física

**RESULTADO-CHAVE**

Implantar novo modelo de ambiente laboral

**INDICADOR**

Percentual de implementação do novo modelo de ambiente laboral

**25%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Otimização dos espaços laborais do Senado Federal;
- ✓ Redução de custos relacionados a espaços laborais para o Senado.



## OBJETIVO

Readequar a estrutura física

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

## RESULTADO-CHAVE

Recuperar 100% das esquadrias do anexo I

## RISCO

Baixo

## SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

No órgão técnico para elaboração do Termo de Referência

## INDICADOR

Percentual de recuperação das esquadrias no Anexo I

**25%**

## UNIDADE RESPONSÁVEL

SINFRA

## VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

R\$ 700.000,00 para toda a execução do projeto



## OBJETIVO

Readequar a estrutura física

## RESULTADO-CHAVE

Recuperar 100% das esquadrias do anexo I

## INDICADOR

Percentual de recuperação das esquadrias no Anexo I

**25%**

## BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Eliminação das infiltrações nos gabinetes que ocorrem pela fachada do Anexo 1;
- ✓ Preservação do patrimônio público.



## OBJETIVO

Readequar a estrutura física

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Substituir os sistemas de som dos Plenários das Comissões

## RISCO

Baixo

## UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

## INDICADOR

Percentual dos sistemas de som dos Plenários das Comissões substituídos

**50%**



## OBJETIVO

Readequar a estrutura física

## RESULTADO-CHAVE

Substituir os sistemas de som dos Plenários das Comissões

## INDICADOR

Percentual dos sistemas de som dos Plenários das Comissões substituídos

**50%**

## BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Substituição de equipamentos de som obsoletos e com alto risco de indisponibilidade.



## OBJETIVO

Readequar a estrutura física

## ATINGIMENTO

Sim

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

## RESULTADO-CHAVE

Adequar todos os Plenários das Comissões para realização de reuniões de forma remota ou semipresencial

## RISCO

Inexistente

## SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Licitação já realizada

## INDICADOR

Percentual de Plenários das Comissões adequados para a realização de forma remota ou semipresencial

**100%**

## UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

**OBJETIVO**

Readequar a estrutura física

**RESULTADO-CHAVE**

Adequar todos os Plenários das Comissões para realização de reuniões de forma remota ou semipresencial

**INDICADOR**

Percentual de Plenários das Comissões adequados para a realização de forma remota ou semipresencial

**100%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Possibilidade de realização de reuniões remotas ou semipresenciais em todos os plenários das comissões do Senado Federal;
- ✓ Integração das reuniões remotas ou semipresenciais das comissões com a TV Senado.





## OBJETIVO

Readequar a estrutura física

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Adequar estrutura física das unidades de apoio a área legislativa em decorrência do modelo de trabalho

## RISCO

Baixo

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SGM

## INDICADOR

Percentual das unidades de apoio a área legislativa com estrutura física adequada em decorrência do novo modelo de trabalho

**50%**

**OBJETIVO**

Readequar a estrutura física

**RESULTADO-CHAVE**

Adequar estrutura física das unidades de apoio a área legislativa em decorrência do modelo de trabalho

**INDICADOR**

Percentual das unidades de apoio a área legislativa com estrutura física adequada em decorrência do novo modelo de trabalho

**50%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Melhoria do ambiente de trabalho na Secretaria-Geral da Mesa;
- ✓ Ampliação da integração entre as equipes da Secretaria-Geral da Mesa;
- ✓ Racionalização de uso do espaço físico da Secretaria-Geral da Mesa;
- ✓ Agilidade no atendimento aos usuários da Secretaria-Geral da Mesa;
- ✓ Aumento da transparência da atividade legislativa;
- ✓ Redução de custos relacionados ao espaço físico da Secretaria-Geral da Mesa.



Objetivo

## 6. Preservar a memória do Senado



## OBJETIVO

Preservar a memória do  
Senado

## ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Lançar a plataforma Arquivo  
Senado  
(AtoM + Archivemática)

## RISCO

Inexistente

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SGIDOC

## INDICADOR

Quantidade de plataformas  
Arquivo Senado lançadas

**1/1**

**OBJETIVO**

Preservar a memória do  
Senado

**RESULTADO-CHAVE**

Lançar a plataforma Arquivo  
Senado  
(AtoM + Archivemática)

**INDICADOR**

Quantidade de plataformas  
Arquivo Senado lançadas

**1/1**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Preservação de longo prazo para documentos digitais, com requisitos que visam garantir a manutenção da autenticidade dos documentos;
- ✓ Difusão, de forma ativa, de documentos históricos de interesse social;
- ✓ Redução dos pedidos de pesquisa recebidos nos canais de atendimento do Arquivo ou outros canais de solicitação de informações;
- ✓ Integração de sistemas de negócio ou de gestão de documentos ao repositório arquivístico, de maneira a garantir a preservação e integridade dos documentos de longa guarda ou de guarda permanente.



## OBJETIVO

Preservar a memória do Senado

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Sim

## RESULTADO-CHAVE

Substituir o software da Biblioteca (Aleph) por uma Plataforma de Serviços (LSP)

## RISCO

Baixo

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

## SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

No órgão técnico para elaboração do Termo de Referência

## INDICADOR

Percentual de implantação da nova Plataforma de Serviços

**50%**

## UNIDADE RESPONSÁVEL

SGIDOC

**OBJETIVO**

Preservar a memória do  
Senado

**RESULTADO-CHAVE**

Substituir o software da  
Biblioteca (Aleph) por  
uma Plataforma de Serviços  
(LSP)

**INDICADOR**

Percentual de implantação da  
nova Plataforma de Serviços

**50%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Aprimoramento da gestão dos bibliotecários sobre o acervo do Senado Federal;
- ✓ Aumento da satisfação do usuário que demanda informação bibliográfica para sua tomada de decisão.



## OBJETIVO

Preservar a memória do Senado

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Disponibilizar na Central de Serviços solução para empréstimo e devolução de obras de arte

## RISCO

Médio

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

## UNIDADE RESPONSÁVEL

SGIDOC

## INDICADOR

Quantidade de soluções para empréstimo e devolução de obras de arte disponibilizados

0/1



**OBJETIVO**

Preservar a memória do Senado

**RESULTADO-CHAVE**

Disponibilizar na Central de Serviços solução para empréstimo e devolução de obras de arte

**INDICADOR**

Quantidade de soluções para empréstimo e devolução de obras de arte disponibilizados

0/1

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Agilidade e simplificação do processo de solicitação de empréstimos, devoluções e guarda temporária de obras de arte, por meio de formulários eletrônicos;
- ✓ Disponibilização das imagens das obras de arte com melhor qualidade;
- ✓ Possibilidade de solicitar serviço de restauração por meio de formulário eletrônico;
- ✓ Integração entre sistemas e serviços que precisam ser acionados para realização das atividades de empréstimos, devoluções e guarda temporária de obras de arte;
- ✓ Atualização automática do catálogo de obras disponibilizadas para empréstimo;
- ✓ Agilidade na produção de relatórios de obras emprestadas, devolvidas e em guarda provisória.



## OBJETIVO

Preservar a memória do Senado

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Substituir a tecnologia de suporte à página de Anais do Senado

## RISCO

Médio

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

## UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

## INDICADOR

Percentual de implantação da nova tecnologia de suporte à página de Anais do Senado

**50%**

**OBJETIVO**

Preservar a memória do  
Senado

**RESULTADO-CHAVE**

Substituir a tecnologia de  
suporte à página de Anais do  
Senado

**INDICADOR**

Percentual de implantação da  
nova tecnologia de suporte à  
página de Anais do Senado

**50%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Ampliação do acesso da sociedade às informações disponíveis no acervo de Anais do Senado Federal;
- ✓ Disponibilização de uma pesquisa eficaz à memória da atividade legislativa do Senado Federal.



Objetivo

## **7. Priorizar as atividades fins do Senado**



## OBJETIVO

Priorizar as atividades fins  
do Senado

## ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Implementar aplicativo de  
informações legislativas

## RISCO

Inexistente

SITUAÇÃO DO  
PROJETO DE TI

Concluído

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SGM

## INDICADOR

Percentual de implementação  
do aplicativo de informações  
legislativas

**100%**

**OBJETIVO**

Priorizar as atividades fins do Senado

**RESULTADO-CHAVE**

Implementar aplicativo de informações legislativas

**INDICADOR**

Percentual de implementação do aplicativo de informações legislativas

**100%**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Aplicativo que possibilite aos senadores utilizarem smartphones e outros dispositivos portáteis para:
  - comprovação de presença em sessões plenárias e reuniões de comissões;
  - assinatura de proposições e documentos legislativos;
  - votação de em sessões plenárias e reuniões de comissões.



## OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

## ATINGIMENTO

Sim

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Implementar sistemática de visualização da tramitação unificada Câmara/Senado

## RISCO

Inexistente

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Concluído

## UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

## INDICADOR

Percentual de implementação da sistemática de visualização da tramitação unificada Câmara/Senado

**100%**



## OBJETIVO

Priorizar as atividades fins  
do Senado

## ATINGIMENTO

Sim

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Reativar o Grupo Interlegis de  
Tecnologia (GITEC)

## RISCO

Inexistente

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

ILB

## INDICADOR

Quantidade de reuniões do  
Grupo Interlegis de Tecnologia  
realizadas

**1/1**



**OBJETIVO**

Priorizar as atividades fins do Senado

**RESULTADO-CHAVE**

Reativar o Grupo Interlegis de Tecnologia (GITEC)

**INDICADOR**

Quantidade de reuniões do Grupo Interlegis de Tecnologia realizadas

**1/1**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Integração, troca de conhecimentos e aprimoramento profissional entre profissionais de Tecnologia da Informação de Casas Legislativas dos três Poderes das esferas da Federação (municipal, estadual e federal);
- ✓ Aprimoramento de maturidade da gestão de tecnologias existente nos órgãos dos três Poderes das esferas da Federação (municipal, estadual e federal);
- ✓ Ampliação da eficiência, da eficácia, da economicidade, do uso de boas práticas e, no caso das Casas Legislativas, a ampliação da democratização das comunidades nas quais estão presentes;
- ✓ Participação do Senado Federal na ampliação do processo democrático nos municípios e nos estados onde as Casas Legislativas apoiadas pelo Programa Interlegis;
- ✓ Aumento na percepção positiva de imagem perante os Legislativos e as população locais.



## OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Não

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Obter a adesão de 10% dos vereadores ao Interlegis até o final da legislatura municipal

## RISCO

Médio

## UNIDADE RESPONSÁVEL

ILB

## INDICADOR

Percentual de vereadores que aderiam ao Interlegis:

**8%/10%**



## OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

## RESULTADO-CHAVE

Obter a adesão de 10% dos vereadores ao Interlegis até o final da legislatura municipal

## INDICADOR

Percentual de vereadores que aderiam ao Interlegis:

**8%/10%**

## BENEFÍCIOS PLANEJADOS

- ✓ Fortalecimento da imagem do Senado Federal;
- ✓ Atuação efetiva em prol do aperfeiçoamento das ferramentas e práticas dos Legislativos Municipais;
- ✓ Integração em rede do Senado com os Legislativos Municipais;
- ✓ Acesso a conteúdos relevantes para gestão, transparência e exercício da cidadania para os Legislativos Municipais.



## OBJETIVO

Priorizar as atividades fins  
do Senado

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Não

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Estabelecer plano de ação de  
segurança cibernética

## RISCO

Alto

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

PRODASEN

## INDICADOR

Quantidade de planos de ação  
de segurança cibernética  
implementados

**0/1**

**OBJETIVO**

Priorizar as atividades fins do Senado

**RESULTADO-CHAVE**

Estabelecer plano de ação de segurança cibernética

**INDICADOR**

Quantidade de planos de ação de segurança cibernética implementados

**0/1**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Proteção das informações e dos recursos de processamento da informação (ativos de hardware e software) no ambiente computacional do Senado Federal;
- ✓ Mecanismos e sistemáticas com o objetivo de avaliar, rastrear e corrigir continuamente as vulnerabilidades dos ativos (hardware e software) no ambiente computacional do Senado Federal;
- ✓ Redução dos riscos institucionais relacionados à segurança cibernética, tais como:
  - inoperância de serviços e sistemas institucionais;
  - roubo e/ou sequestro de dados sensíveis ou sigilosos;
  - danos à confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações críticas para a instituição;
  - extravio de dados, descumprimento de procedimentos e da legislação e/ou regulamentações,
  - invasão de privacidade
  - vulnerabilidades nas redes.



## OBJETIVO

Priorizar as atividades fins  
do Senado

## ATINGIMENTO

Não

DEPENDE DE  
PROJETO DE TI

Sim

DEPENDE DE  
CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Implantar portal de normas  
federais

## RISCO

Alto

SITUAÇÃO DO  
PROJETO DE TI

Em execução

UNIDADE  
RESPONSÁVEL

SGM

## INDICADOR

Quantidade de portais de  
normas federais implantados

0/1

**OBJETIVO**

Priorizar as atividades fins do Senado

**RESULTADO-CHAVE**

Implantar portal de normas federais

**INDICADOR**

Quantidade de portais de normas federais implantados

**0/1**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Concretamente, o Congresso Nacional, sob a liderança do Senado Federal e participação da Câmara dos Deputados, assumirá efetivamente a função institucional, que lhe é própria, de órgão responsável pela consolidação das normas federais.



## OBJETIVO

Priorizar as atividades fins do Senado

## ATINGIMENTO

Não

## DEPENDE DE PROJETO DE TI

Sim

## DEPENDE DE CONTRATAÇÃO

Não

## RESULTADO-CHAVE

Publicar novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense

## RISCO

Médio

## SITUAÇÃO DO PROJETO DE TI

Em execução

## UNIDADE RESPONSÁVEL

SGM

## INDICADOR

Quantidade de novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense publicados

0/4



**OBJETIVO**

Priorizar as atividades fins do Senado

**RESULTADO-CHAVE**

Publicar novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense

**INDICADOR**

Quantidade de novos Painéis Legislativo e Parlamentar nos Portais do Senado Federal e do Congresso Nacional com o uso do QlikSense publicados

**0/4**

**BENEFÍCIOS PLANEJADOS**

- ✓ Disponibilização de informações referentes a atuação parlamentar do Senado para os usuários internos dos gabinetes parlamentares por meio da Intranet;
- ✓ Disponibilização de informações referentes a atuação parlamentar do Senado para todos os cidadãos por meio da Internet.
